LP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV
CALLE 11 No. 1484-1, COL. POCITOS Y RIVERA, VERACRCRUZ, VER.
C.P. 91729, TELS: 012299393659 Y 69, lp@ver.megared.net..mx, www.LPCyM .com.mx
Invitacion Restringida PREACERO PELLIZZARI MEXICO SA DE CV
BARDA DE COLINDANCIA DE 1,200.00 M² ALTERNATIVA B
Hoja 1, Fecha de Presentacion de Propuesta: 12 de AGOSTO de 2004
45 Dias Naturales de Tiempo de Ejecucion

Programa de Obra para Barda Perimetral Opcion B

ID	Clv. Con	Descripción	Inicia	Duración	Termina
		BARDA DE COLINDANCIA ALTERNATIVA B			
		PRELIMINARES			
30	1	TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE COLOCAR ALINEACIONES, PUENTES, REFERENCIAS TOPOGRAFICAS, HILOS DE TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA ALINEACION DE LA PARED PERIMETRAL	15/Oct/2004	2c	16/Oct/2004
		EXCAVACIONES			
50	2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA DE 0.00 A 0.80 MTS DE PROFUNDIDAD CON UN ANCHO MAXIMO DE ZANJA DE 1.20 MTS. INCLUYE DEPOSITAR EL MATERIAL A UN LADO DE LA EXCAVACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	15/Oct/2004	10c	24/Oct/2004
60	3	AFINE DE FONDO DE EXCAVACIONES CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE DEJAR LA SUPERFICIE LISTA PARA COMPACTACION, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	17/Oct/2004	10c	26/Oct/2004
70	4	COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO MECANICO BAILARINA DEL FONDO DE LA EXCAVACION INCLUYE: AGUA,VERIFICACION DE NIVELES Y TALUDES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANODE OBRA. ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA YCOMPLETA EJECUCION.	17/Oct/2004	10c	26/Oct/2004
80	5	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS., AL 90% PROCTORSTD., MEDIDO COMPACTO,UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	10/Nov/2004	12c	21/Nov/2004
90	6	CARGA DEL MATERIAL Y ACARREO EN CARRETILLA A 20.00 M DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTODE EXCAVACIONES. INCLUYE:CARGA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	21/Nov/2004	8c	28/Nov/2004
		CIMENTACION, ESTRUCTURA Y MUROS.			
110	7	CONCRETO DE F'C 250 KG/CM2 A LOS 28 DÍAS, ACABADO CORRIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES (BASES, ESCALONES, PEDESTALES) Y VIGAS DE RIOSTRA. INCLUYE EL TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA EL SITIO DE OBRA. EXCLUYE EL REFUERZO METÁLICO Y EL E	20/Oct/2004	30c	18/Nov/2004
120	8	CONCRETO DE F'C 250 KG/CM2 A LOS 28	30/Oct/2004	30c	28/Nov/2004

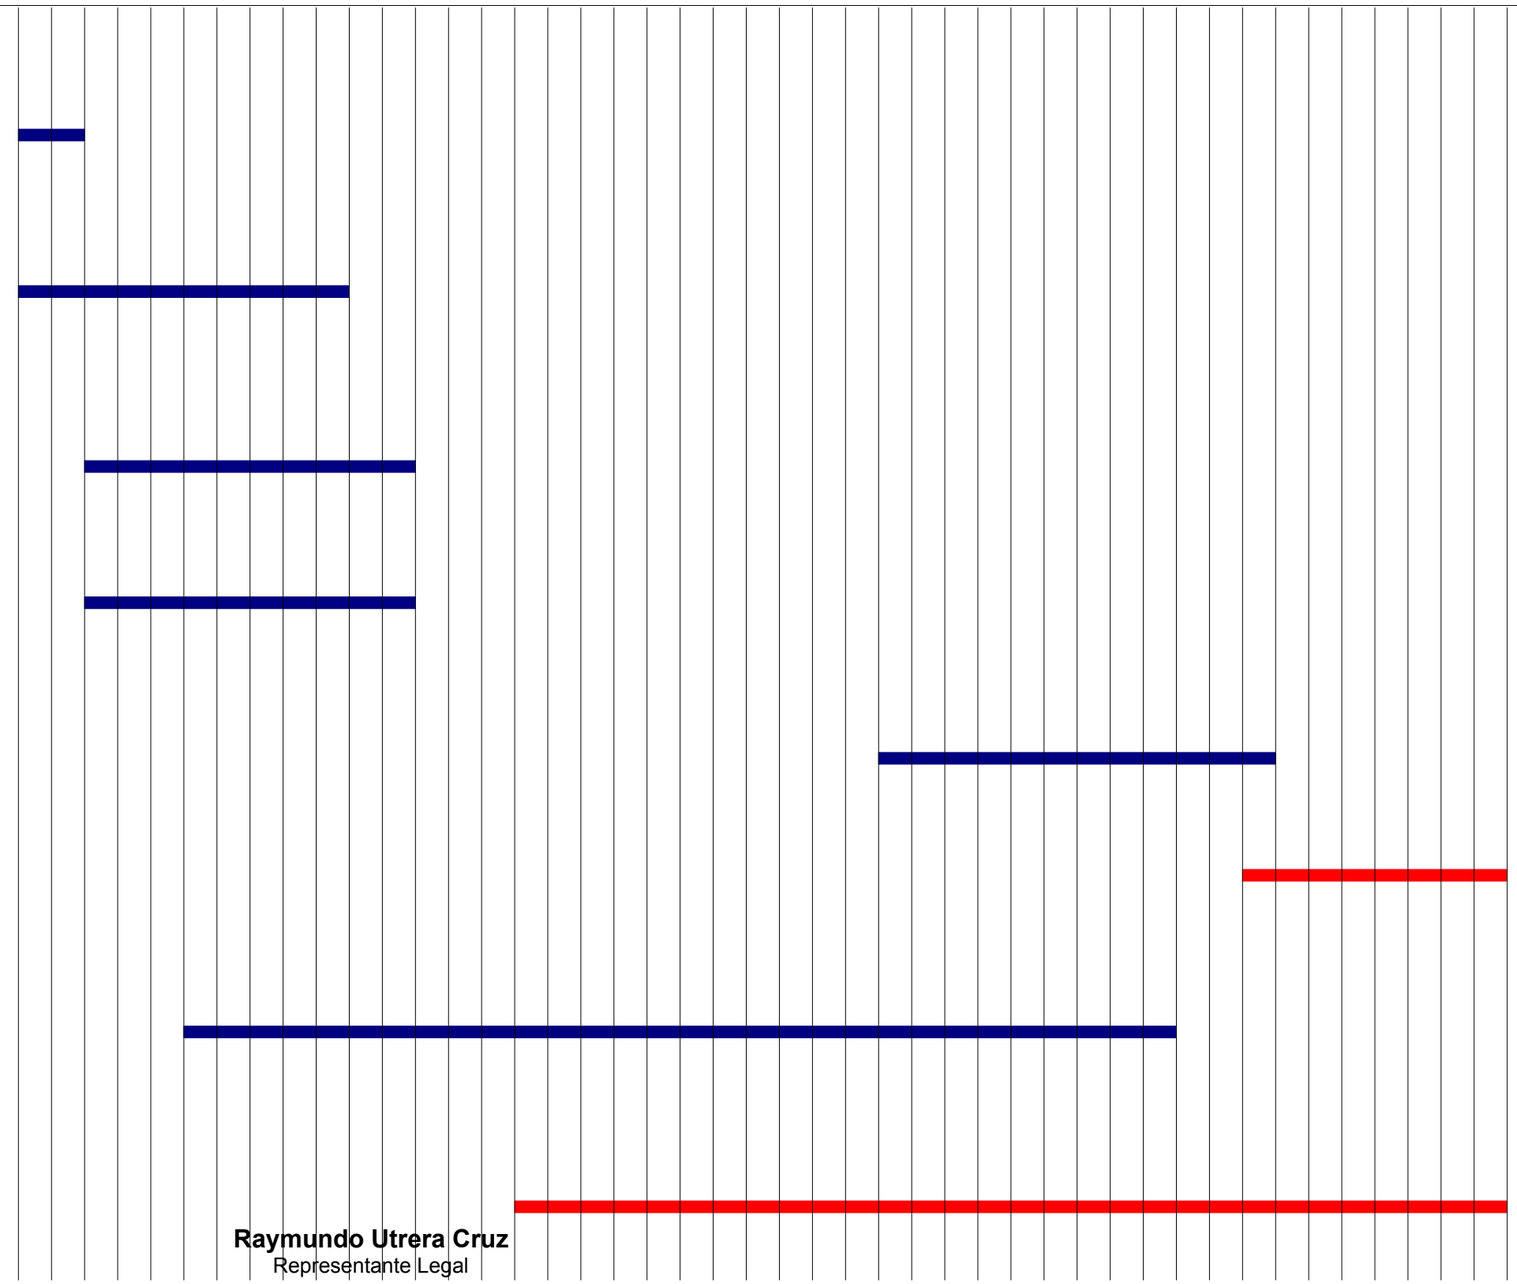

Raymundo Utrera Cruz
Representante Legal

LP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV
CALLE 11 No. 1484-1, COL. POCITOS Y RIVERA, VERACRCRUZ, VER.
C.P. 91729, TELS: 012299393659 Y 69, lp@ver.megared.net..mx, www.LPCyM .com.mx
Invitacion Restringida PREACERO PELLIZZARI MEXICO SA DE CV
BARDA DE COLINDANCIA DE 1,200.00 M² ALTERNATIVA B
Hoja 2, Fecha de Presentacion de Propuesta: 12 de AGOSTO de 2004
45 Dias Naturales de Tiempo de Ejecucion

Ubicacion:
Santa Fe, VERACRUZ, Mexico
P agina No. 2
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Ing. Fernando Martinez
Ing. Dorys Sandoval

Programa de Obra para Barda Perimetral Opcion B

ID	Clv. Con	Descripción	Inicia	Duración	Termina
		DÍAS, ACABADO CORRIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIGA CORONA INCLUYE EL TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA EL SITIO DE OBRA. EXCLUYE ELREFUERZO METÁLICO Y EL E			
130	9	ENCOFRADO METÁLICO, TIPO RECTO ACABADO CORRIENTE EN BASES, PEDESTALES Y VIGAS DE RIOSTRA, TIRANTES, FUNDACIONES DE PARED, LOSA DE FUNDACIONES, VIGAS CORONAS, VIGAS DE FUNDACIÓN Y BASES DE PAVIMENTOS	17/Oct/2004	30c	15/Nov/2004
140	10	SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 KGF/CM2 UTILIZANDO CABILLAS DE 1/4, 3/8, 1/2 DE PGDA.PARA INFRAESTRUCTURA.	15/Oct/2004	30c	13/Nov/2004
150	11	CONSTRUCCION DE PARED FORMADA POR PANTALLAS PREFABRICADAS SEGÚN DISEÑO.	25/Oct/2004	30c	23/Nov/2004

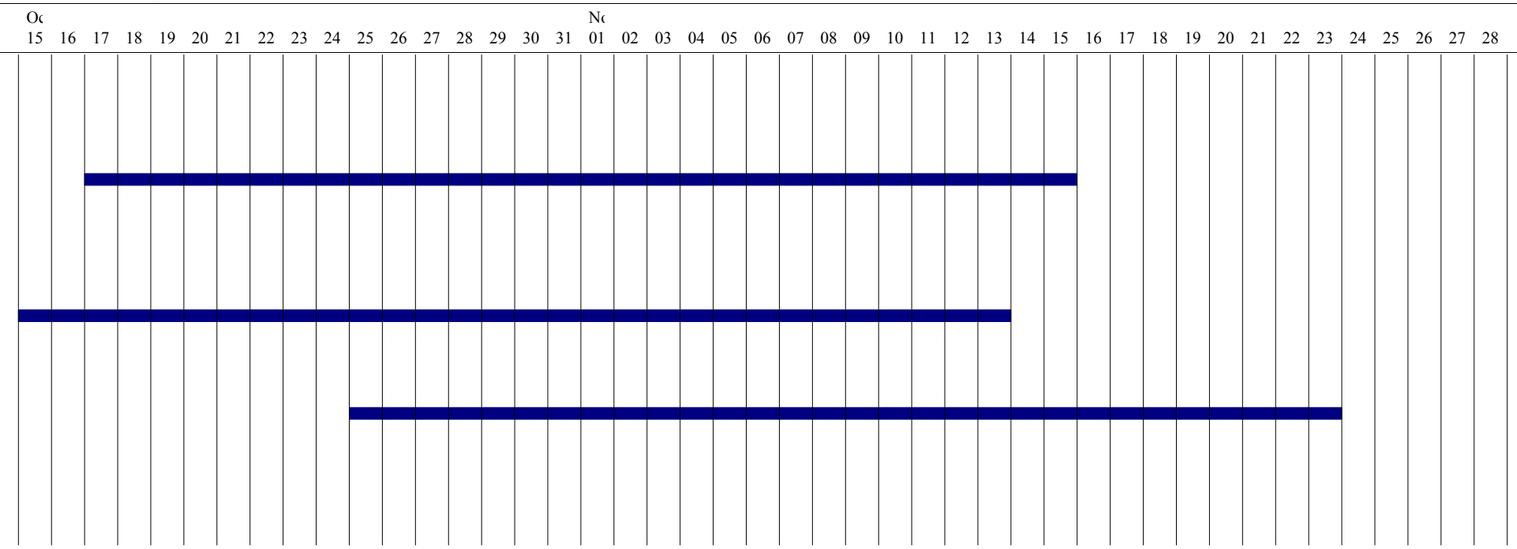

Raymundo Utrera Cruz
Representante Legal
